
## PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES I

#### TRABAJO PRÁCTICO N2- GESTIÓN DE PROYECTOS

1) REALIZAR EL GRÁFICO DE PROCESOS Y SUS DEPENDENCIAS.

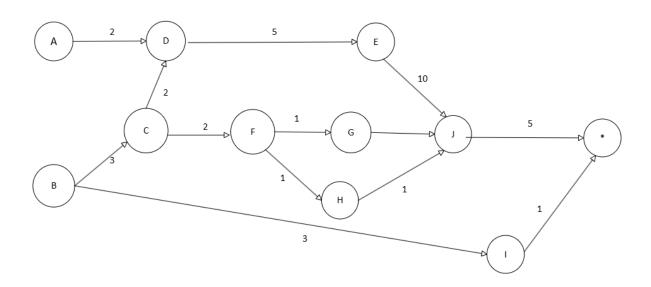

• Identificar todos los caminos posibles y su correspondiente duración.

\*Camino I: A, D, E, J: 22 días

\*Camino II: B, C, D, E, J: 25 días

\*Camino III: B, C, F, G, J: 16 días

\*Camino IV: B, C, F, H, J: 12 días

\*Camino V: B, I: B, I: 4 días


. Identificar el camino crítico.

El camino crítico es B, C, D, E, J con una duración de 25 días

2) Para el siguiente proyecto de desarrollo e implementación de un programa de gestión de inventario, especificar (inicialmente) las dependencias según su criterio:

	_		DURACIÓN
	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIAS	(días)
Α	Realizar el relevamiento de la necesidad		5
В	Comprar hardware para el nuevo sistema (para		
	usuarios)	A	2
С	Instalación de sistema operativo (para usuarios)	В	2
D	Definir las tareas a realizar para el desarrollo	Α	1
Е	Implementar versión de prueba (para usuarios)	F	1
F	Instalar software de prueba (para usuarios)	С	1
G	Desarrollar (programar) el sistema	K	10
Н	Implementación final del aplicativo	G	1
- 1	Aprobación de usuarios (pruebas)	J	0,5
J	Realizar pruebas de usuarios	Н	0,5
K	Creación de la base de datos	D	1
1	Capacitación de funcionalidades del nuevo		
L	sistema		1,5

. Realizar el gráfico de procesos.

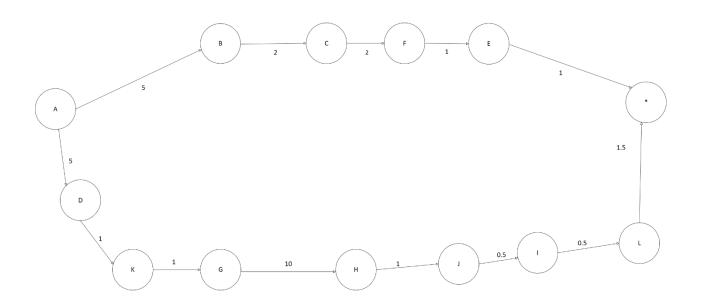

. Identificar todos los caminos posibles y su correspondiente duración.


\*Camino I: A, B, C, F, E: 11 días

\*Camino II: A, D, K, G, H, J, I, L: 20.5 días

. Identificar el camino crítico.

### El camino crítico es A, D, K, G, H, J, I, L con una duración de 20.5 días

### 3) Realizar el gráfico de procesos.



Identificar todos los caminos posibles y su correspondiente duración.

\*Camino I: A, C: 17 días

\*Camino II: A, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N: 77 días

\*Camino III: B, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N: 64 días

\*Camino IV: B, L, M, N: 7 días

• Identificar el camino crítico.


El camino crítico es A, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N con una duración de 77 días

4) Definir las actividades de un proyecto para la construcción de una casa: Fases, actividades, duración de las actividades y relaciones de dependencia.

Gráfico de tabla.

	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIAS	DURACIÓN (días)
Α	Diseño arquitectónico		30
В	Cotización de materiales	А	10
С	Limpieza y nivelación del terreno	А	5
D	Excavación y cimentación	С	10
Е	Construcción de columnas y losa	D	15
F	Paredes y techo	E	20
G	Instalación eléctrica	F	8
Н	Instalación hidráulica	F	8
1	Instalación de ventanas y puertas	F	5
J	Yeso y repellado	G,H,I	10
K	Pintura interior-exterior	J	7
L	Instalación de pisos	J	5
М	Pruebas de sistemas	K,L	3
Ν	Limpieza final	M	2
0	Inspección y entrega	N	1

# . Gráfico de procesos.

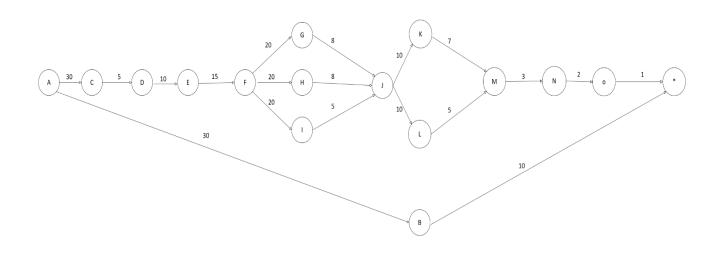

• Identificar todos los caminos posibles y su correspondiente duración.

\*Camino I: A, B: 40 días

\*Camino II: A, C, D, E, F, G, J, K, M, N, O: 111 días

\*Camino III: A, C, D, E, F, G, J, L, M, N, O: 109 días

\*Camino IV: A, C, D, E, F, H, J, K, M, N, O: 111 días

\*Camino V: A, C, D, E, F, H, J, L, M, N, O: 109 días

\*Camino VI: A, C, D, E, F, I, J, K, M, N, O: 108 días \*Camino VII: A, C, D, E, F, I, J, L, M, N, O: 106 días

• Identificar el camino crítico.

El camino crítico es A, C, D, E, F, G, J, K, M, N, O con una duración de 111 días El camino crítico es A, C, D, E, F, H, J, K, M, N, O con una duración de 111 días
